



# Baustellentagebuch

Neubau

Berufliches Staatliches Schulzentrum Pfarrkirchen



## Juni 2026

Am Schulgebäude laufen die Installation der Elektro-, Lüftungs-, Wasser- und Abwasserleitung läuft nach wie vor auf Hochtouren. In der Ebene E3 ist der Estrich fertig, in der Ebene E2 wird er gerade eingebracht. In der Ebene 1 wurde mit der Bodendämmung und Fußbodenheizung begonnen. Trockenbau: Im 3.OG sind die Wände fertig gestellt, die Deckenmontage hat begonnen. Im 2.OG ist ein Großteil der Wände geschlossen. Im 1.OG sind die Wände einseitig beplankt. Im EG wird die Unterkonstruktion der Wände gestellt, teils sind die Wände bereits einseitig beplankt.




Im Baufeld der Werkstatt\_04 ist die Installation von Elektro, Lüftung, Wasser und Abwasser größtenteils montiert. Die Unterkonstruktion der Trockenbauwände in den Sanitärbereichen sowie die dazugehörigen Unterbaukästen der Sanitäreinrichtungen sind verbaut. Die ersten Decken werden montiert.

Bei der Werkstatt\_03 läuft die Installation für Elektro, Lüftung, Wasser und Abwasser, die ersten Unterkonstruktionen für die Decken sind montiert.

In der Werkstatt\_02 werden die Zwischenwände werden beplankt und gedämmt. Die Installationsarbeiten haben begonnen.

In der Werkstatt\_01 sind die Zwischenwände gestellt und sind größtenteils beplankt. Die Blechfassade im Dachraum ist fertiggestellt. Mit den Installationsarbeiten wurde begonnen

Im Außenbereich sind die östlichen, westlichen und nördlichen Regen- und Schmutzwasserleitungen verlegt und ans öffentliche Kanalnetz angeschlossen. Die ersten gepachteten Flächen werden zurückgebaut.

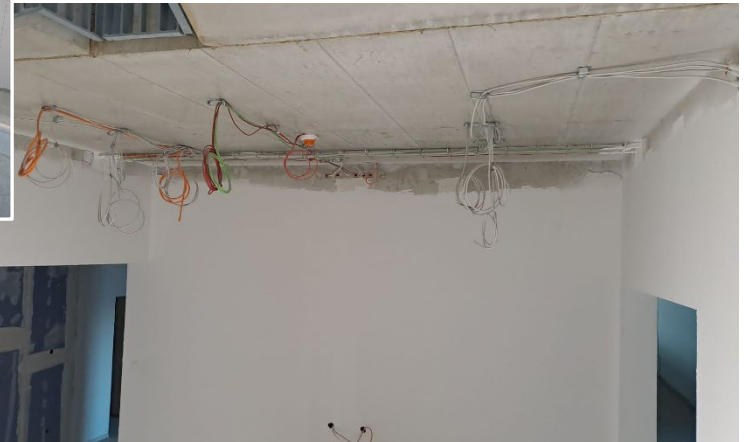



## Mai 2026

Am Schulgebäude laufen die Installation der Elektro-, Lüftungs-, Wasser- und Abwasserleitung läuft nach wie vor auf Hochtouren. In der Ebene E3 wurde der Estrich eingebracht. In der Ebene E2 wurde ein Großteil der Bodendämmung und ein Teil der Fußbodenheizung verlegt. Im 3.OG sind die Wände fertig gestellt. Im 2.OG werden nach wie vor die Wände geschlossen. Im 1.OG sind die Wände Großteils einseitig beplankt. Im EG wird die Unterkonstruktion der Wände gestellt. Parallel dazu werden in Teilbereichen die Wände bereits einseitig beplankt.



Im Baufeld der Werkstatt\_04 ist die Installation von Elektro, Lüftung, Wasser und Abwasser größtenteils montiert. Die Unterkonstruktion der Trockenbauwände in den Sanitärbereichen sowie die dazugehörigen Unterbaukästen der Sanitäreinrichtungen sind verbaut. Die ersten Unterkonstruktionen für die abgehängte Decke sind angebracht.




Bei der Werkstatt\_03 sind die Zwischenwände beidseitig beplankt und die Installation für Elektro, Lüftung, Wasser und Abwasser wird montiert.

In der Werkstatt\_02 werden die Zwischenwände werden beplankt und gedämmt. Die Installationsarbeiten haben begonnen.

In der Werkstatt\_01 sind die Zwischenwände gestellt und werden beplankt. Die Blechfassade im Dachraum ist fertiggestellt.

Im Außenbereich sind die östlichen Regen- und Schmutzwasserleitungen verlegt und ans öffentliche Kanalnetz angeschlossen. Nun folgt die westliche Seite.

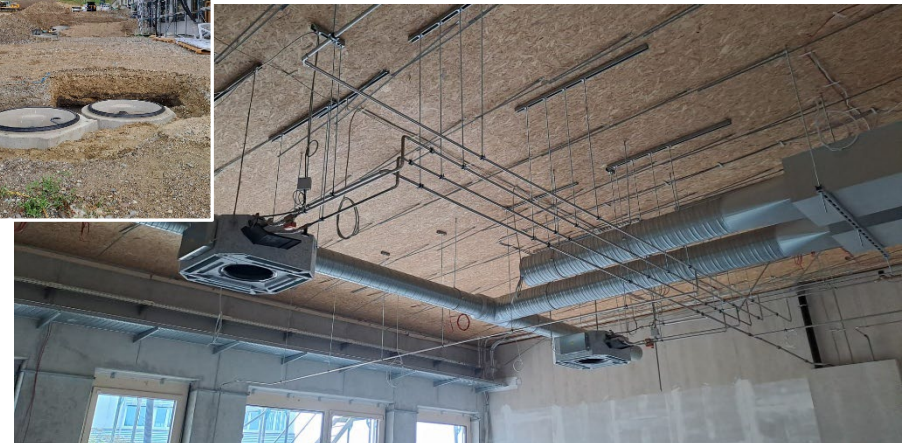



## April 2026

Am Schulgebäude ist die Fassade an zwei Seiten fertiggestellt und das Gerüst teilweise schon zurückgebaut. Die Installation der Elektro-, Lüftungs-, Wasser- und Abwasserleitung läuft nach wie vor. In der Ebene E3 ist ein Großteil der Bodendämmung und der Fußbodenheizung verlegt. Teilweise wurde bereits der Estrich eingebracht. Im 3. OG sind die Wände nahezu fertig gestellt. Im 2. OG werden diese aktuell geschlossen. Im 1. OG sind die Wände großteils einseitig beplankt und im EG wird die Unterkonstruktion der Wände gestellt, parallel dazu werden in Teilbereichen die Wände bereits einseitig beplankt



Im Baufeld der Werkstatt\_04 läuft die Installation von Elektro, Lüftung, Wasser und Abwasser. Die Unterkonstruktion der Trockenbauwände in den Sanitärbereichen sowie die dazugehörigen Unterbaukästen der Sanitäreinrichtungen sind verbaut und die Blechfassade im Bereich des Dachraumes angebracht.

Bei der Werkstatt\_03 sind die Zwischenwände beidseitig beplankt und die Installation für Elektro, Lüftung, Wasser und Abwasser hat begonnen. Die Blechfassade im Bereich des Dachraumes ist angebracht.

In der Werkstatt\_02 wurden im Hallenbereich an der Decke die OSB-Platten als Installationsebene montiert. Die Zwischenwände werden beplankt und gedämmt. Die Blechfassade im Dachraum ist angebracht.

In der Werkstatt\_01 wurden im Hallenbereich an der Decke die OSB-Platten als Installationsebene montiert. Die ersten Zwischenwände sind gestellt sowie Fenster und Türen montiert. Die Blechfassade im Dachraum wird angebracht.

Im Außenbereich werden die Regen- und Schmutzwasserleitungen verlegt und ans öffentliche Kanalnetz angeschlossen.





## März 2026

Am Schulgebäude erfolgt derzeit die Montage der vorgehängten Blechfassade sowie die Installation der Elektro-, Lüftungs-, Wasser- und Abwasserleitung. Die ersten Elektroverteiler werden installiert. Im 3.OG sind die Wände beidseitig geschlossen und es wird die Ausgleichsschicht für die Dämmung unter dem Estrich eingebracht. Im 2.OG werden die ersten Wände beidseitig beplankt. Im 1. OG sind die Wände teils einseitig beplankt. Im EG wird die Unterkonstruktion für die Gipskartonwände gestellt.



Im Baufeld der Werkstatt\_04 sind die Zwischenwände beidseitig beplankt und es wurde mit der Elektro-, Lüftungs- und Wasserinstallation begonnen. Fenster, Türen und Tore wurden montiert. Bei der Werkstatt\_03 sind die ersten Zwischenwände beplankt. Fenster, Türen und Tore wurden montiert. Im Hallenbereich der Werkstatt\_02 wurden an der Decke die OSB-Platten als Installationsebene montiert und die ersten Zwischenwände gestellt. Fenster und Türen sind montiert. In der Werkstatt\_01 ist die Dacheindeckung nahezu fertig, Fenster und Türen wurden montiert.



Im Baufeld des Logistikgebäudes sind die Rohbauarbeiten abgeschlossen.





## Februar 2026

Am Schulgebäude erfolgt derzeit die Montage der vorgehängten Blechfassade sowie die Installation der Elektro-, Lüftungs-, Wasser- und Abwasserleitung und Trockenbauarbeiten. Im 3.OG werden die ersten Wände beidseitig beplankt. Im 2.OG sind die Wände Großteils einseitig beplankt. Im 1.OG wird aktuell die Unterkonstruktion für die Gipskartonwände gestellt. Im EG sind die Räume für die Elektroverteilung errichtet



Im Baufeld der Werkstatt\_04  
Die werden die Zwischenwände beplankt. Bei der Werkstatt\_03 sind die ersten Zwischenwände gestellt. Im Hallenbereich der Werkstatt\_02 wurden an der Decke die OSB-Platten als Installationsebene montiert. In der Werkstatt\_01 wurden die Nagelplattenbinder gestellt.



Im Baufeld des Logistikgebäudes sind die Rohbauarbeiten abgeschlossen.



## Januar 2026

Am Schulgebäude ist die Fenster- / Pfostenriegelmontage abgeschlossen. Aktuell erfolgt die Montag der vorgehängten Blechfassade, der Elektroleitungen, der Lüftungsleitungen und der Wasser- und Abwasserleitungen. Die Trockenbauarbeiten laufen auf Hochtouren und die ersten Elektroverteilerkästen wurden gestellt. Im Bereich der Installationsschächte werden die Stahlbühnen / Gitterrostpodeste eingebaut.



Bei der Werkstatt\_01 werden die Arbeiten am Dachstuhl aufgenommen, sobald es die Witterung zulässt. Im Baufeld des Logistikgebäudes sind die Rohbauarbeiten abgeschlossen.

Im Baufeld der Werkstatt\_04 wurde im Bereich des Kopfbaus das Dach gedämmt sowie die Deckenuntersicht eingebracht. Die ersten Holz-Zwischenwände werden errichtet. Bei der Werkstatt\_03 wurden im Hallenbereich an der Decke die OSB-Platten als Installationsebene montiert. Im Bereich des Kopfbaus wurde das Dach gedämmt sowie die Decke eingebracht. Bei der Werkstatt\_02 sind Dachdeckerarbeiten nahezu abgeschlossen.





## Dezember 2025

Am Schulgebäude ist die Fenster- / Pfostenriegelmontage nahezu abgeschlossen. Im Anschluss werden die Fensterflügel eingehängt. Derzeit erfolgt die Montage der vorgehängten Blechfassade, der Elektroleitungen, der Lüftungsleitungen, der Wasser- und Abwasserleitungen und die Trockenbauarbeiten. In den Elektroräumen wurde die Fußbodendämmung und der Estrich eingebracht.



Im Baufeld der Werkstatt\_04 sind die Dachdeckerarbeiten abgeschlossen. Im Hallenbereich wurden an der Decke die OSB-Platten als Installationsebene montiert und sämtliche Versorgungsleitungen ins Gebäude verlegt sowie die Fenster montiert. Die Dachdeckerarbeiten in der Werkstatt\_02 und 03 sind abgeschlossen. In der Werkstatt\_01 sind die Betonarbeiten abgeschlossen.



Im Baufeld des Logistikgebäudes sind die Rohbauarbeiten abgeschlossen.



## November 2025

Im Baufeld des Schulgebäudes sind die Dachdeckerarbeiten, die Fenster-/ Pfostenriegelmontage sowie die Montage der Glasflächen nahezu abgeschlossen. Die vorgehängte Blechfassade und die Elektrik wird derzeit montiert. Die ersten Heizungsleitungen wurden verlegt, die Lüftungskanäle sowie die Unterkonstruktionen der Trockenbauwände werden montiert. Die Bauheizung mittels Fernwärme von den Holzwerken Pfarrkirchen wurde in Betrieb genommen.



Im Baufeld der Werkstatt\_04 sind die Dachdeckerarbeiten nahezu abgeschlossen. Derzeit werden die Dachrinnen und die Ausstiege montiert. Im Hallenbereich sind die OSB-Platten als Installationsebene montiert. Alle Versorgungsleitungen sind bis ins Gebäude verlegt. Bei der Werkstatt\_03 ist Dachkonstruktion ist errichtet. Bei der Werkstatt\_02 wird diese derzeit errichtet. Parallel dazu erfolgt die Dacheindeckung mittels Sandwichpaneele. Bei der Werkstatt\_01 sind die Betonarbeiten abgeschlossen.

Im Baufeld des Logistikgebäudes sind die Rohbauarbeiten abgeschlossen.





## Oktober 2025

Im Baufeld des Schulgebäudes sind die Dachdecker sind nach wie vor am Werk und die Montage der Fenster- / Pfostenriegel läuft. Die Montage der vorgehängte Blechfassade hat begonnen, Kabeltrassen wurden im Schulgebäude verlegt, Die ersten Heizungsleitungen wurden verlegt. Die Montage der Lüftungskanäle läuft. Die Montage der Unterkonstruktion der Trockenbauwände hat begonnen.



Im Baufeld der Werkstätten sind die Betonarbeiten abgeschlossen. Bei der Werkstatt\_04 erfolgt aktuell die Dacheindeckung mittels Sandwichpaneele. Die komplette Dachkonstruktion der Werkstatt\_03 ist errichtet.



Im Baufeld des Logistikgebäudes sind die Rohbauarbeiten abgeschlossen.




## September 2025

Im Baufeld des Schulgebäudes sind die Zimmererarbeiten abgeschlossen und das Dach wird abgedichtet. Derzeit finden die Fenster- / Pfostenriegelmontage sowie die Montage der Glasflächen statt. Die Unterkonstruktion für die vorgehängte Blechfassade wird hergestellt und die ersten Kabeltrassen wurden im Schulgebäude verlegt. Die Montage der Lüftungskanäle und Lüftungsgeräte hat begonnen.



Im Baufeld der Werkstätten sind die Betonarbeiten abgeschlossen. Bei der Werkstatt\_04 wurde die Dachkonstruktion mittels Nagelplattenbinder im Hallenbereich sowie ein Großteil des Dachstuhls im Sozialbereich errichtet. Bei der Werkstatt\_03 wurden die Nagelplatten-binder zur späteren Aussteifung montiert. Bei der Werkstatt\_01 werden die letzten Wände im Obergeschoss des Sozialtraktes betoniert.

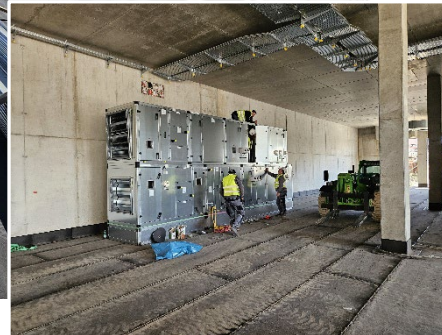

Im Baufeld des Logistikgebäudes sind die Rohbauarbeiten abgeschlossen.

## August 2025

Die Errichtung des Dachstuhls am Schulgebäude ist so gut wie abgeschlossen. Restarbeiten werden ausgeführt. Die Fenster- / Pfostenriegel- sowie Glasflächenmontage schreitet voran. Die ersten Trassen für Elektro und Heizungen werden montiert



Bei der Werkstatt\_02 ist die Bodenplatte betoniert Und Außen- und Innenwände werden errichtet.

Bei der Werkstatt\_01 wurde der erste Teil der Bodenplatte betoniert.



Bei der Werkstatt\_03 sind die Betonbauarbeiten so gut wie abgeschlossen. Restarbeiten, wie z.B. Betonkosmetik, werden ausgeführt

Im Baufeld des Logistikgebäudes sind die Rohbauarbeiten abgeschlossen.



## Juli 2025

Die Montage der vorgehängten Fertigteilfassade in der Ebene\_0 am Schulgebäude ist fertiggestellt. Am kompletten Gebäude wurde das Fassadengerüst inkl. Dachfangerüst montiert. Derzeit wird der Dachstuhl aufgerichtet. Aktuell erfolgt die Fenster- / Pfostenriegelmontage. Auf der westlichen Seite werden die ersten Glasflächen eingesetzt.



Im Baufeld der Werkstatt\_01 ist der unterkellerte Bereich inkl. Zwischendecke fertig gestellt. Die Fundamente wurden betoniert

Bei der Werkstatt\_02 sind 2/3 der Bodenplatte betoniert, erste Außenwände werden errichtet.



Im Baufeld der Werkstatt\_04 sind die Außenwände errichtet. Im Sozialtrakt wurde die Decke über E1 betoniert

In der Werkstatt\_03 ist 1/3 der Bodenplatte betoniert. Die ersten Außenwände werden errichtet.

Im Baufeld des Logistikgebäudes sind die Rohbauarbeiten abgeschlossen.





## Juni 2025

Die Rohbauarbeiten am Schulgebäude sind fertig gestellt. Die Kräne sind abgebaut und im Erdgeschoss wird die vorgehängte Fertigteilfeassade montiert. Im ersten Stock wurde mit der Fenstermontage begonnen.



Im Baufeld der Werkstatt\_01 ist zwischenzeitlich der unterkellerte Bereich inkl. Zwischendecke fertiggestellt. Die Fundamente wurden betoniert

Im Baufeld der Werkstatt\_02 sind 2/3 der Bodenplatte betoniert.

Im Baufeld des Logistikgebäudes sind die Rohbauarbeiten abgeschlossen.



Im Baufeld der Werkstatt\_04 sind ca. 2/3 der Außenwände fertiggestellt. Derzeit werden die Innenwände im Bereich des Sozialtraktes errichtet.

Im Baufeld der Werkstatt\_03 wurde die Sauberkeitsschicht eingebracht.



## Mai 2025

Die Rohbauarbeiten am Schulgebäude sind fertig gestellt. Ein Kran auf der westlichen Seite und Teile des Gerüsts wurden bereits abgebaut. Von Westen her kann mit der Montage der vorgehängten Fertigteilfassade begonnen werden. An der westlichen Grundstücksgrenze wurden drei Schluckbrunnen errichtet, mit denen das „umgeleitete Grundwasser“ wieder dem Grundwasser zugeführt wird.



Im Baufeld der Werkstatt\_02 wurde der Raum hinter dem unterkellerten Bereich aufgefüllt.

Im Baufeld der Werkstatt\_01 wurden im unterkellerten Bereich die Zwischenwände errichtet. Aktuell werden die Unterzüge für die Decke eingeschalt und bewährt.

Im Baufeld des Logistikgebäudes sind die Rohbauarbeiten abgeschlossen.

Im Baufeld der Werkstatt\_03 wurden die Drainageleitungen verlegt. Aktuell erfolgt der Einbau Grundleitungen unter der Bodenplatte.

Im Baufeld der Werksatt\_04 wurden sämtliche Grundleitungen unter der Bodenplatte verlegt und die restliche Sauberkeitsschicht eingebracht sowie Dämmung verlegt. Die restliche Abdichtung unter der Bodenplatte wurde erstellt und die Giebelwand auf der nördlichen Seite eingeschalt und bewährt.





## April 2025

Im Baufeld des Schulgebäudes ist die Ebene 2 fertig gestellt. Es sind rund 1/3 der Innen- und Außenwände in der Ebene 3 betoniert und die Deckenarbeiten laufen.



Im Baufeld des Logistikgebäudes sind die Rohbauarbeiten abgeschlossen.

Im Baufeld der Werkstatt\_03 und \_04 wurde hinter dem unterkellerten Bereich hinterfüllt.

Im Baufeld der Werkstatt\_02 wurde im unterkellerten Bereich die Decke über E0 betoniert.

Im Baufeld der Werkstatt\_01 werden im unterkellerten Bereich aktuell die Außenwände errichtet.



## März 2025

Im Baufeld Schulgebäude wurden ein Großteil der Innen- und Außenwände in der Ebene\_E2 errichtet und die Hälfte der Decke über E2 betoniert. Fertigteiltreppen in den beiden Treppenhäusern wurden ebenfalls versetzt.



Im Baufeld des Logistikgebäudes sind die Rohbauarbeiten abgeschlossen.



Im Bereich der Werkstatt\_03 wurde im unterkellerten Bereich die Decke über E0 betoniert.

Im Bereich der Werkstatt\_02 wurde im unterkellerten Bereich alle Außenwände errichtet.

Im Bereich der Werkstatt\_01 wurde im unterkellerten Bereich die Sauberkeitsschicht eingebracht.




## Februar 2025


Im Baufeld Schulgebäude wurden in der Ebene\_E1 alle Außen- und Innenwände errichtet. 1/3 der Decke über E1 ist betoniert und in der Ebene E2 werden die ersten Außen- und Innenwände errichtet.



Im Baufeld des Logistikgebäudes sind die Rohbauarbeiten abgeschlossen.

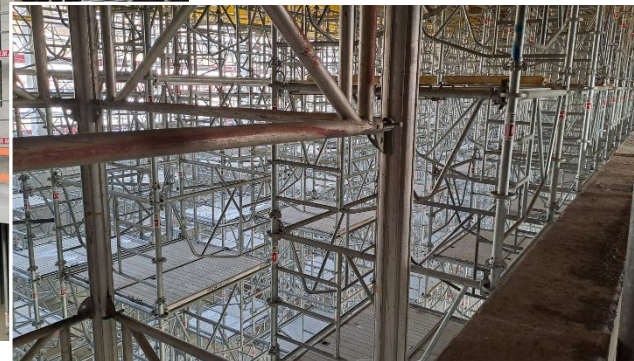

Im Baufeld Werkstätten wurde bei der Werksatt\_04 im unterkellerten Bereich die Decke über E0 und der erste Teil der Bodenplatte betoniert. Bei der Werkstatt\_03 wurden im unterkellerten Bereich alle Außenwände errichtet und die Schalung für die Decke über E0 verlegt. Bei der Werkstatt\_02 wurde im unterkellerten Bereich die Sauberkeitsschicht eingebracht. Ebenso wurde die Abdichtung aufgebracht

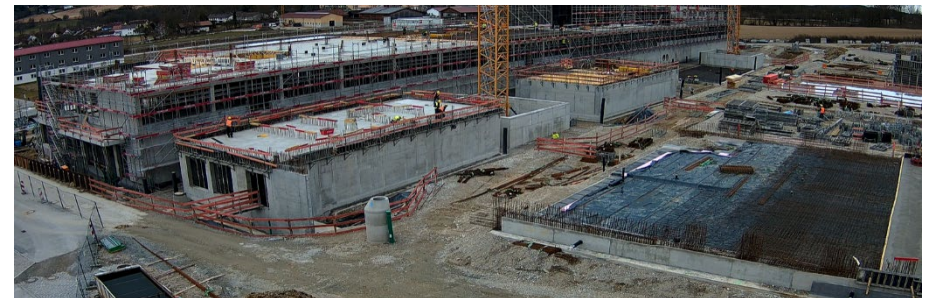

## Januar 2025

Im Baufeld des Schulgebäudes wurde der letzte Abschnitt der Decke über E0 betoniert. In der Ebene\_E1 wurden weitere Außen- und Innenwände errichtet.



Im Baufeld des Logistikgebäudes sind die Rohbauarbeiten abgeschlossen.

Im unterkellerten Bereich der Werkstatt\_04 wurde die Schalung für die Decke verlegt und im Bereich der Bodenplatte mit dem Verlegen der Abdichtung begonnen.

Im unterkellerten Bereich der Werkstatt\_03 wurde die Bodenplatte und die ersten Außenwände im Bereich des unterkellerten Bereiches errichtet.



## Dezember 2024

Im Baufeld des Schulgebäudes ist der Großteil der Decke über E0 in verschiedenen Abschnitte bewehrt und betoniert. In der Ebene\_E1 wurden weitere Außen- und Innenwände errichtet.



Beim Logistikgebäude wurde das endgültige Geländer als Absturzsicherung montiert.

Beim Baufeld der Werksatt\_04 wurden im unterkellerten Bereich weitere Außen- und Innenwände errichtet. Ein Teil der Sauberkeitsschicht im Bereich der Bodenplatte wurde betoniert. In der Werkstatt\_03 wurden im unterkellerten Bereich die Sauberkeitsschicht, die Abdichtung sowie die erste Lage der Bewehrung verlegt. Die Bodenplatten der Gruben für z. B. Kfz-Hebebühnen wurden hergestellt. In der Werkstatt\_02 wurden im unterkellerten Bereich die Drainagen verlegt.



## November 2024

Im Baufeld des Schulgebäudes sind in der Ebene\_E0 sind alle Außen- und Innenwände errichtet. Die sogenannte Himmelsleiter im Bereich der späteren Aula wurde montiert. Die Hälfte der Decke über E0 wurde in verschiedenen Abschnitte bewehrt und betoniert. Die ersten Außen- und Innenwände in der Ebene\_E1 wurden errichtet.



Beim Baufeld der Werksatt\_04 im unterkellerten Bereich wurde die Bodenplatte und ein Teil der Außen- und Innenwände errichtet. Im unterkellerten Bereich der Werkstatt\_03 wurden die Drainagen verlegt und die Sauberkeitsschicht eingebracht. Die Gruben für die spätere Werkstattausstattung, werden hergestellt.



Die Rohbauarbeiten am Logistikgebäude sowie die Arbeiten an der darüber liegenden Berme sind abgeschlossen.





## Oktober 2024

Im Baufeld des Schulgebäudes sind die Außenwände fertig gestellt. In der Ebene\_E0 werden die letzten Innenwände bewehrt und betoniert. Der erste Teil der Decke über E0 wurde betoniert.



Die Rohbauarbeiten am Logistikgebäude sowie die Arbeiten an der darüber liegenden Berme sind abgeschlossen.



Im unterkellerten Bereich der Werkstatt\_04 wurden die Drainagen verlegt. Im Bereich der Fundamente wurde ein Teil der Sauberkeitsschicht eingebracht. Die ersten Bewehrungskörbe für die Fundamente werden geflochten.

Im Bereich der späteren Gruben für Hebebühnen der Werkstatt\_03 wurde die Sauberkeitsschicht eingebracht.

## September 2024

Im Baufeld des Schulgebäudes ist die Bodenplatte fertig gestellt.  
Beim Schulgebäude, Ebene\_E0 werden die Innen- und Außenwände bewehrt und betoniert.



Nach knapp einem Jahr konnte die Bodenstabilisierung Ende September 2024 abgeschlossen werden.



Die Rohbauarbeiten am Logistikgebäude sind abgeschlossen. Aktuell erfolgen die Restarbeiten an der Berme, oberhalb des Logistikgebäudes.



## August 2024

Im Baufeld des Schulgebäudes ist bereits ein Teil der Bodenplatte hergestellt. Aktuell erfolgt der Einbau der Bewehrung im Bereich der Bodenplatte. Die ersten Wände vom Schulgebäude, im Bereich der späteren Kantine, wurden bereits betoniert.



Die Übergabe des Baufelds der Werkhalle\_04 ist an die Baufirma erfolgt. Im Bereich der Werkhalle\_03 wurde das Planum mit den erforderlichen Gruben hergestellt. Aktuell erfolgt die Bodenstabilisierung mittels Rüttelstopfsäulen im Bereich der Werkhalle\_02.



Im Baufeld der Logistikgebäude ist das Granulat für die Dachbegrünung aufgebracht. Restarbeiten, wie z.B. die Betonkosmetik am Logistikgebäude werden ausgeführt. Die Berme über, sowie westlich dem Logistikgebäude ist fertig gestellt.



## Juli 2024

Die endgültigen Drainagen im Baufeld werden eingebaut. Im Bereich der Aufzüge ist die Sauberkeitsschicht eingebracht. Die Kranfundamente sind fertig und die Kräne für die Rohbauarbeiten werden gestellt. Im Baufeld des Schulgebäudes ist die Sauberkeitsschicht eingebaut. Aktuell wird die Abdichtungsfolie unter der Bodenplatte eingebracht und im östlichen Bereich wurde mit dem Verlegen der Bewehrung für die Bodenplatte begonnen.



Das Planum der Werkhalle\_04 ist fertig gestellt. Übergabe an die ausführende Firma ist für KW31 angedacht. Aktuell wird im Bereich der Werkhalle\_03 das Planum mit den erforderlichen Gruben hergestellt.



Am Logistikgebäude werden derzeit Restarbeiten wie z. B. die Betonkosmetik ausgeführt. Aktuell erfolgt die Erstellung der Berme über, sowie östlich und westlich, dem Logistikgebäude.

## Juni 2024

Die zwei Hochbaukräne sind gestellt. Die „untere“ Böschung, westlich vom Logistikgebäude, wurde hergestellt. Die westliche Bohrpfehlwand wurde freigelegt.



Die Bodenstabilisierung im Bereich der Werkstatt 4 und Werkstatt 3 ist fertig gestellt. Aktuell erfolgt die Bodenstabilisierung mittels Rüttelstopfsäulen im Bereich der Werkstatt 2.



Nach wie vor wird der Arbeitsraum zwischen Logistikgebäude und Bohrpfehlwand verfüllt.

## Mai 2024

Der Auftragnehmer Rohbau hat mit der Baustelleneinrichtung begonnen und bereits die Containeranlage für das Baubüro und Lager errichtet. Die Achsen wurden vom Vermessungsbüro an den Auftragnehmer übergeben.



Im Baufeld des Logistikgebäudes sind die Dämmarbeiten in der finalen Phase. Parallel dazu wird der Arbeitsraum zwischen Logistikgebäude und Bohrspfahlwand verfüllt.

Die Bodenstabilisierung im Bereich der Werkstatt 4 ist fertig gestellt. Aktuell erfolgt die Bodenstabilisierung mittels Rüttelstopfsäulen im Bereich der Werkstatt 3.



## April 2024

Das Baufeld im Bereich des Schulgebäudes ist Großteils fertig gestellt und die bauzeitlichen Drainagen, zur Abführung des Oberflächenwassers nach Regenereignissen, im Bereich des Schulgebäudes sind verbaut. Die Achsen des Schulgebäudes wurden bereits eingemessen.



Die Bodenstabilisierung der unterkellerten Bereiche der Werkstätten und die Kranstellplätze sind fertig gestellt. Derzeit erfolgt die Bodenstabilisierung im Bereich der Werkstatt 4

Die Betonarbeiten im Baufeld des Logistikgebäudes sind abgeschlossen. Derzeit werden die Abdicht- und Dämmarbeiten ausgeführt. Die Schal- und Betonarbeiten im Bereich des Kopfbalken der westlichen Bohrpfehlwand sind in vollem Gange.



## März 2024

Die Bodenstabilisierung im Bereich des Schulgebäudes ist abgeschlossen, die Erdarbeiten in diesem Bereich sind zum Großteil abgeschlossen. Die Lage der späteren Aufzüge ist bereits an den zwei Vertiefungen erkennbar. Zur Abführung des Oberflächenwassers nach Regenereignissen werden im westlichen Bereich die bauzeitlichen Drainagen verbaut.



Aktuell erfolgt die Bodenstabilisierung mittels Rüttelstopfsäulen der unterkellerten Bereiche der Werkstätten. Die Stabilisierung im Bereich des ersten Kranstellplatzes ist abgeschlossen.



Die letzten Wände vom Logistikgebäude werden betoniert. Die Schal- und Betonarbeiten im Bereich des Kopfbalken der westlichen Bohrpfehlwand sind in vollem Gange.

## Februar 2024

Im Bereich des Schulgebäudes erfolgt nach wie vor die Bodenstabilisierung mittels Rüttelstopfsäulen. Parallel dazu wird das verdrängte Material verladen und abgefahren und die erforderliche Kiesschicht eingebaut und verdichtet.



Nach dem Fertigstellen der ersten Wände vom Logistikgebäude werden nun die ersten Decken betoniert. Der Kopfbalken im Bereich der östl. Bohrpfehlwand ist bereits fertig. Der Kopfbalken im Bereich der westl. Bohrpfehlwand wird gerade hergestellt.





## Januar 2024

Im Baufeld des Logistikbereichs werden nach dem Fertigstellen der Wände nun die ersten Decken betoniert.



Im Bereich der östlichen Bohrfahlwand wird der Kopfbalken errichtet.





## Dezember 2023

Im Baufeld des Logistikbereichs ist ein Großteil der Bodenplatten fertig gestellt, die ersten Wände sind bereits betoniert.





## 20. Dezember 2023

Aktuell erfolgt die Bodenstabilisierung mittels Rüttelstopfsäulen. Es werden 1.900 RSV-Säulen im Bereich der Schulgebäude eingebracht. Die Spundwand im Bereich der späteren Kantinenanlieferung wurde am 20.12.2023 errichtet.





# Spatenstich am 12. Juni 2023

Neubau

Berufliches Staatliches Schulzentrum Pfarrkirchen



19. Mai 2023





5. Mai 2023





28. April 2023





3. März 2023





24. Februar 2023





17. Februar 2023





27. Januar 2023






## 2. Dezember 2022





## Staatliches Berufliches Schulzentrum Pfarrkirchen

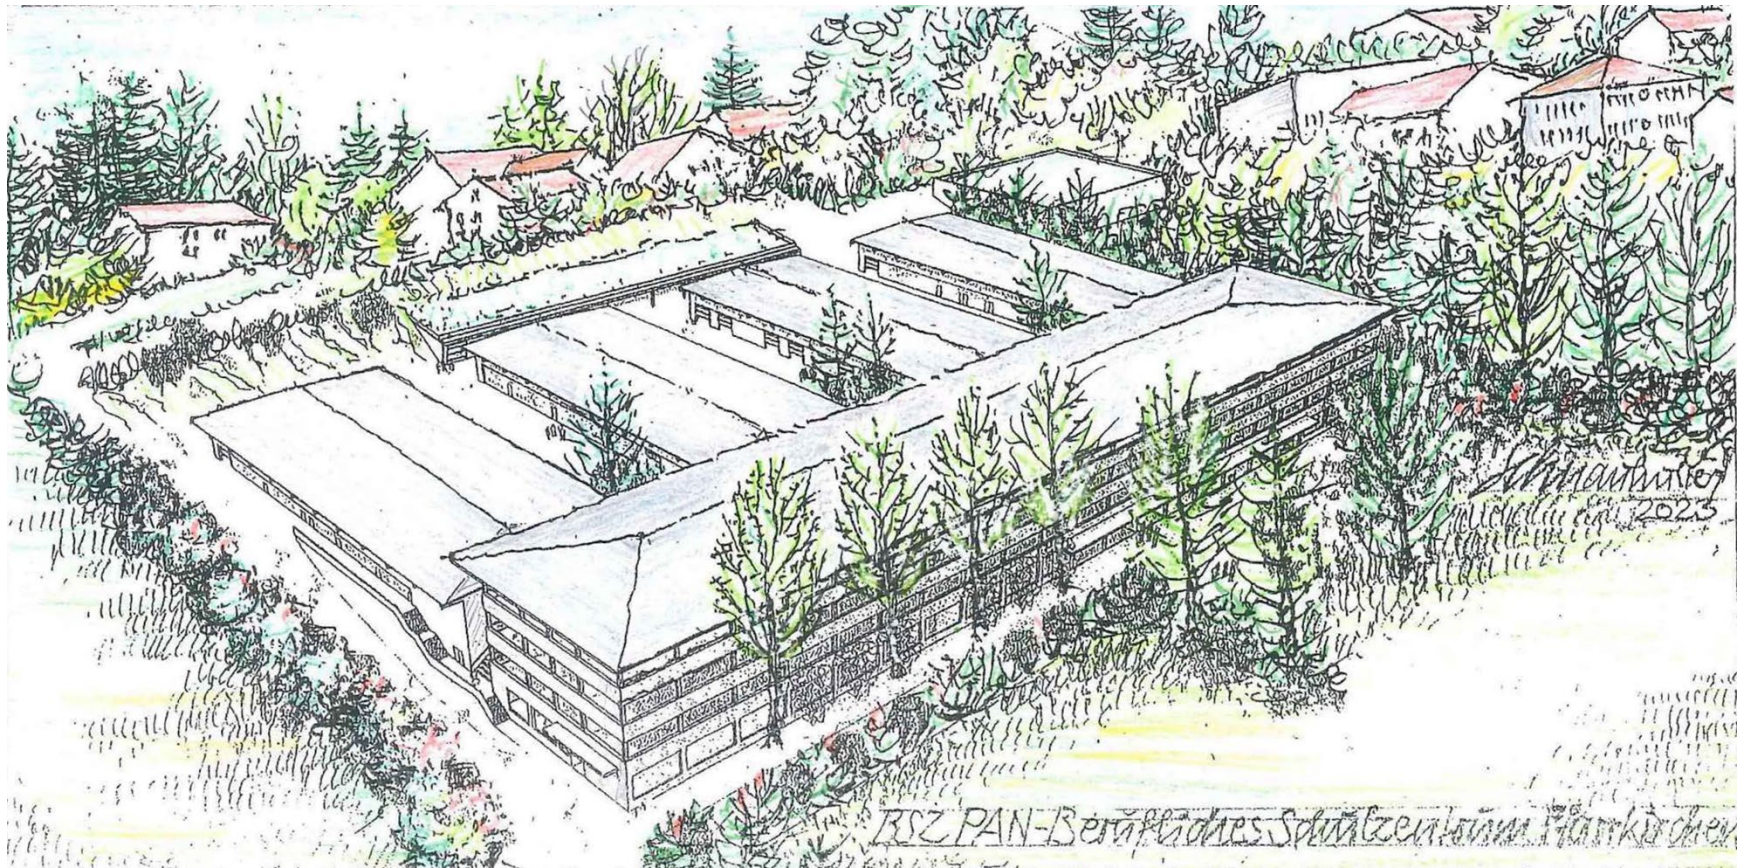




# Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirchen



Gefördert durch die  
Regierung von Niederbayern

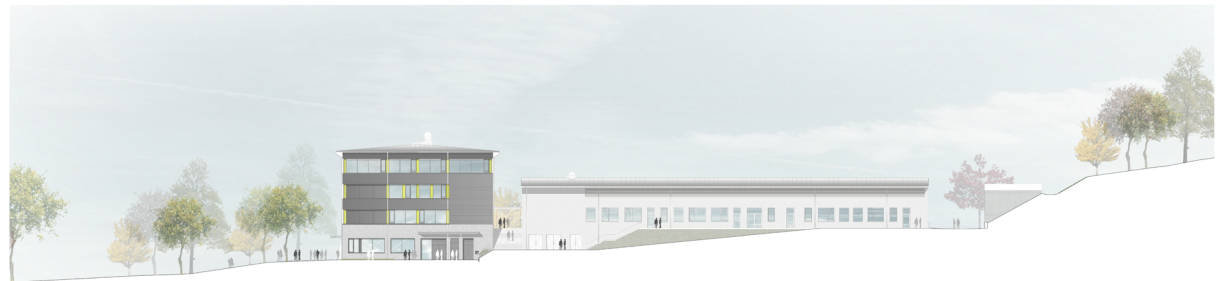

Bauherr

## Landkreis Rottal-Inn

vertreten durch Landrat Michael Fahmüller  
Ringstraße 4-7, 84347 Pfarrkirchen

**Architekten**  
Felix+Jonas Architekten GmbH  
Ickstattstraße 11a  
80469 München

**Landschaftsarchitekten**  
Köppel Landschaftsarchitekt  
Katharinenplatz 7  
84453 Mühlendorf a. Inn

**Tragswerksplanung**  
Mathes Beratende Ing. GmbH  
Töpferstraße 2  
01067 Dresden

**Baugrund**  
Grundbaulabor München GmbH  
Lilienthalallee 7  
80807 München

**Heizung-Lüftung-Sanitärplanung**  
Bummer Hof Planungs-GmbH  
Prinz-Ludwig-Straße 9  
93055 Regensburg

**Elektroplanung, Fördertechnik**  
Coplan AG  
Holmark 35  
84307 Eggenfelden

**Werkstattplanung**  
PBS Weixerau  
Weizenstr. 8  
84174 Weixerau/Eching

**Küchenplanung**  
Tarnofsky & Kirmeier  
Großküchenplanung GmbH  
Am Burgberg 17, 94127 Neuburg

**Spartenkoordination**  
Ingenieurbüro Altmannshofer  
Wochinger Str. 2  
84347 Pfarrkirchen

**SiGeKo**  
Jungthanns safe4u GmbH  
Donaustr.20  
94491 Hengersberg

**Bauphysik Wärmeschutz**  
Klaus Mairhofer Ing. Büro für  
Baustatik und Bauphysik  
Aubergstr. 39, 83352 Altenmarkt

**Bauphysik Schall, Akustik**  
Steger & Partner GmbH  
Frauendörferstr. 57  
81247 München

**Brandschutz**  
Anwander GmbH & Co. KG  
Tretschweg 6  
87477 Sulzberg
